


# Kritiek pad Rc Panels

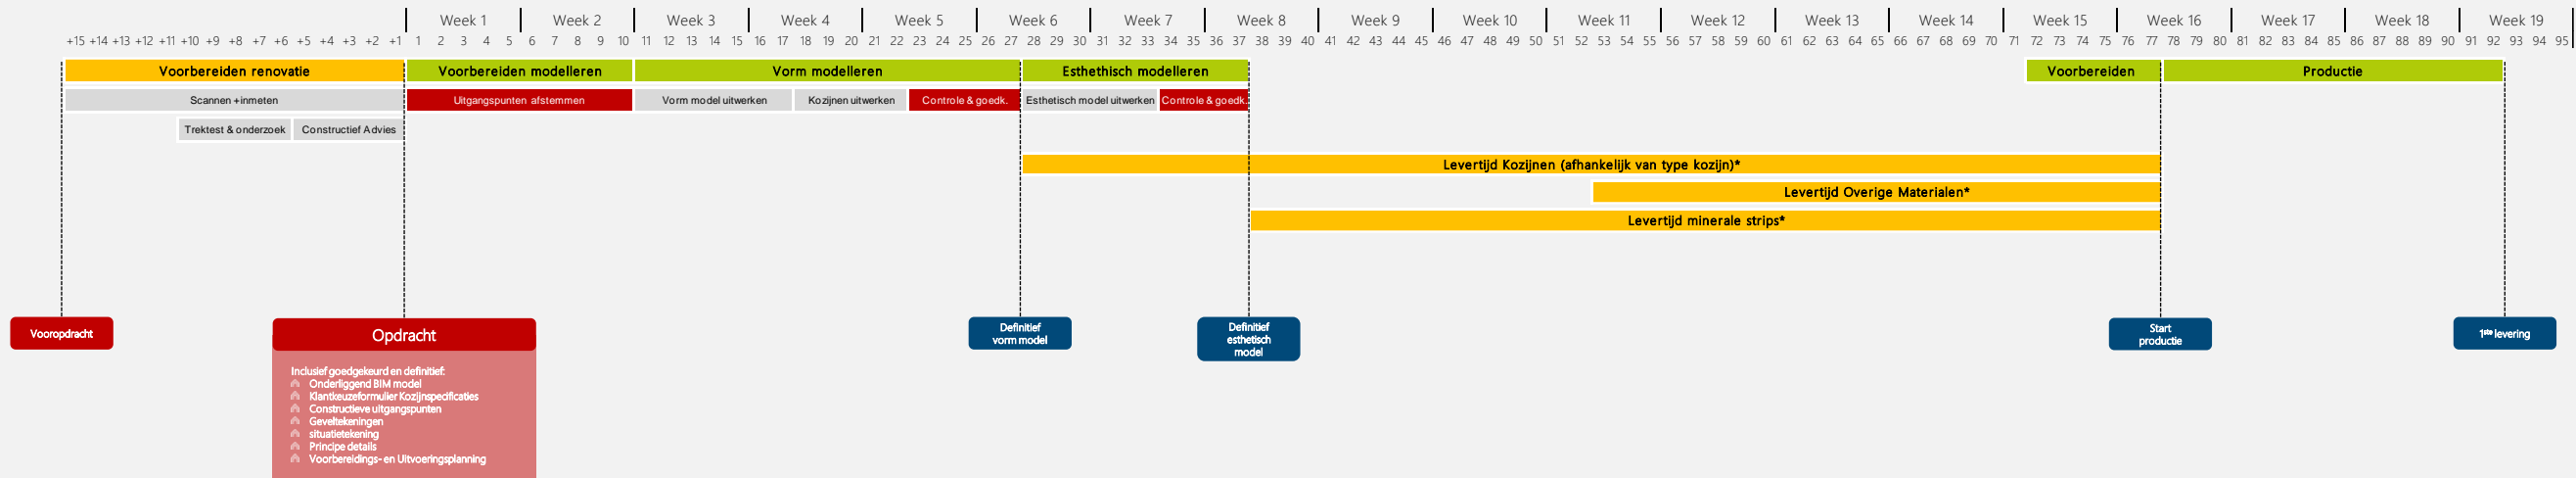

  = actie opdrachtgever

\*Levertijden project specifieke inkoop afhankelijk van leveranciers en indicatief. Kijk voor de actuele levertijden op [www.rcpanels.com/doorlooptijd](http://www.rcpanels.com/doorlooptijd)

In bepaalde gevallen kunnen we er voor kiezen om vanuit de productie planning te beslissen om het voorbereidingstraject naar voren te halen waardoor de tijd tussen productie en levering groter wordt. Uiteraard altijd in onderling overleg.

Voorbereiden modelleren is mede afhankelijk van de kwaliteit en status van de aangeleverde stukken van de opdrachtgever. Het aanleveren van stukken die niet definitief of volledig zijn resulteren in een vertraging van deze stap en daarmee van eerst mogelijk levermoment.

